



รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Progress Status Report)

ประเภท: รายงานภายนอกสำหรับลูกค้า

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่รายงาน: 30 มกราคม พ.ศ. 2569

ช่วงเวลาที่ยื่นรายงาน: 1 มกราคม 2569 - 30 มกราคม 2569


นำเสนอและลงนามในประชุมร่วมลูกค้าครั้งที่ 1/2026 (RBWF_MOM_EXT_20260130)

1. ความคืบหน้าของงานที่เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน

Task No	Task Description	Start Date	End Date	Progress	Duration (days)	Assigned To	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)	01-Jan-2026	31-Jan-2026	97%	31	นายวีระ เนียมโก๊ะ (AN, TL)	■■■■■		
2	พัฒนาระบบหลัก (Core System Development)	01-Feb-2026	15-Apr-2026	0%	74	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)		■■■■■	■■■■■
3	การทดสอบระบบ (System Testing)	16-Apr-2026	30-Apr-2026	0%	15	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)			
4	การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน (UAT)	01-May-2026	20-May-2026	0%	20	นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)			
5	ส่งมอบระบบและประเมินผล (System Delivery)	21-May-2026	31-May-2026	0%	11	นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)			

สรุป: ในช่วงนี้ทีมจัดทำ SOW, PMP, PMPC และ IE แล้วประชุม Kickoff กับลูกค้า

งานวิเคราะห์และออกแบบดำเนินการประมาณ 97% ตามแผน จะปิด Task 1 ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 เอกสาร SRS ยังเป็นฉบับร่าง นัดทวนสอบภายในแล้ว Validation กลางเดือนกุมภาพันธ์ ยังไม่อนุมัติ SRS ในวันนี้

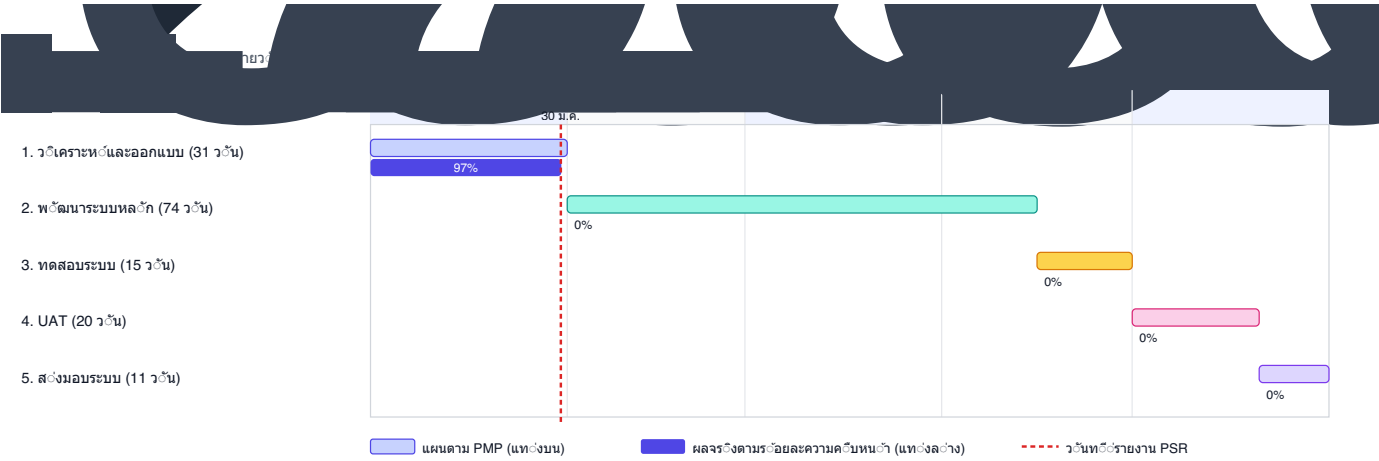

2. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอในระหว่างการดำเนินโครงการ

No	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
1	ข้อกำหนดสิทธิ์ RBAC มีความหลากหลายตามแผนก	จัดทำบทบาทผู้ใช้และ Workflow ในร่าง SRS
2	โครงสร้างฐานข้อมูลสินค้ากระเบื้องซับซ้อน	ทบทวน ER Diagram ร่วมกับ TL ตาม Correction Register รายการ 001

3. เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม (บาท)	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	60,000	ใกล้ปิดงาน Task 1
บุคลากร (พัฒนา / ทดสอบ / UAT / ส่งมอบ)	248,000	0	ยังไม่ถึงงวดงาน
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	5,000	ค่าบริการเดือนมกราคม
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	0	ยังไม่ใช้
รวม	350,000	65,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และการแก้ไขหรือจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ใช้กระบวนการ CR บันทึกที่ RBWF_CR ยังไม่มี CR	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับ Go / Svelte / Docker	ฝึกอบรมในเอกสาร IE	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API และข้อมูล	เตรียม JWT HTTPS RBAC ตามเอกสาร IE	สูง	เฝ้าระวัง
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ใช้ Docker Compose จำลองสภาพแวดล้อม	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงโลบารรี	ฝึกอบรมในเอกสาร IE	ต่ำ	เฝ้าระวัง
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มี Kickoff และรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ความซับซ้อนโครงสร้างฐานข้อมูลสินค้า	ทบทวน ER Diagram และ Normalization ร่วมกับ TL	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

5. ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-001	15/01/2026	นายวีระ เนียมโกะ	รูปแบบรายงานการเงิน PDF ต้องมีตราบริษัท	เพิ่ม Template Logo และ Stamp ในร่าง SRS
ISS-002	22/01/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	ต้องระบุเวอร์ชัน Go runtime ชัดเจน	กำหนด Go 1.22+ ในเอกสาร IE

Change Request

(ไม่มีคำร้องขอเปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคม)

รายงานโดย: นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
วันที่: 30 มกราคม พ.ศ. 2569

ผู้ลงนามรับรองรายงานความก้าวหน้า

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทรวรรณ (นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera N. (นายวีระ เนียมโกะ)	Parinya P. (นายปริญญา พงษ์คนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)
