



รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Progress Status Report)

ประเภท: รายงานภายนอกสำหรับลูกค้า

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่รายงาน: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569


ช่วงเวลาที่ยกมา: 1 กุมภาพันธ์ 2569 - 27 กุมภาพันธ์ 2569

นำเสนอและลงนามในประชุมร่วมลูกค้าครั้งที่ 2/2026 (RBWF_MOM_EXT_20260227)

1. ความคืบหน้าของงานที่เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน

Task No	Task Description	Start Date	End Date	Progress	Duration (days)	Assigned To	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)	01-Jan-2026	31-Jan-2026	100%	31	นายวีระ เนียมโก๊ะ (AN, TL)	■■■■■		
2	พัฒนาระบบหลัก (Core System Development)	01-Feb-2026	15-Apr-2026	35%	74	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)		■■■■■	■■■■■
3	การทดสอบระบบ (System Testing)	16-Apr-2026	30-Apr-2026	0%	15	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)			
4	การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน (UAT)	01-May-2026	20-May-2026	0%	20	นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)			
5	ส่งมอบระบบและประเมินผล (System Delivery)	21-May-2026	31-May-2026	0%	11	นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)			

สรุป: งานวิเคราะห์ปิดตามแผนแล้ว งานพัฒนาหลักประมาณ 35% สานิตโมดูลคลังสินค้าและใบเสนอราคาบน Staging เอกสาร SRS v1.0 ผ่านการทวนสอบภายในและ Validation วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ลูกค้านุมัติเป็น baseline ในวันนี้

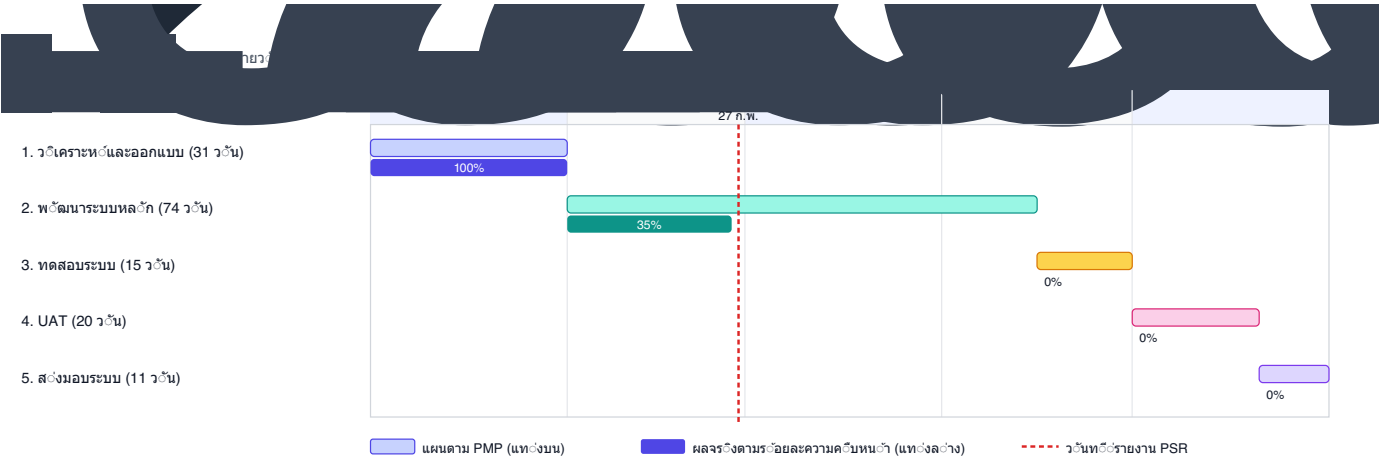

2. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอในระหว่างการดำเนินโครงการ

No	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
1	ความซับซ้อนของการตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน JWT และ RBAC Middleware	พัฒนาสถาปัตยกรรมแยกส่วน Middleware
2	Redis Connection Pool เต็มระหว่างทดสอบภายใน	ปรับ Max Open Connections ใน Go (ISS-003)

3. เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม (บาท)	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด Task 1
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	51,800	ประมาณ 35% ของ Task 2
บุคลากร (ทดสอบ / UAT / ส่งมอบ)	100,000	0	ยังไม่ถึงงวดงาน
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	10,000	สะสม 2 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	0	ยังไม่ใช่
รวม	350,000	123,800	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และการแก้ไขหรือจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ข้อเสนอถ้าไรขึ้นต้นต้องยื่นเป็น CR ในเดือนมีนาคม	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	พัฒนานบสแนกตาม IE	ปานกลาง	กำลังลด
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	แยก JWT และ RBAC Middleware	สูง	กำลังลด
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	ปรับตารางตาม PSR	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	กำลังลด
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ประสิทธิภาพการค้นหาสินค้าเมื่อข้อมูลมาก	สร้าง Index บน MySQL และใช้ Redis cache	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

5. ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-003	12/02/2026	นายปริญญา พงษ์คนตรี	Redis Connection Pool เต็มระหว่างทดสอบ	ปรับ Max Open Connections ใน Go
ISS-004	20/02/2026	นายประกาศิต ทองนอก	การเรียงลำดับรายการสินค้าในคลัง	เพิ่มพารามิเตอร์ Sorting ใน REST API

Change Request

(ไม่มีคำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ยื่นในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอจากลูกค้าเรื่องรายงานกำไรขั้นต้น)

รายงานโดย: นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผู้ลงนามรับรองรายงานความก้าวหน้า

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทรวรรณ (นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera N. (นายวีระ เนียมโกะ)	Parinya P. (นายปริญญา พงษ์คนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)
