



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_PSR_20260327



รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Progress Status Report)

ประเภท: รายงานภายนอกสำหรับลูกค้า

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่รายงาน: 27 มีนาคม พ.ศ. 2569

ช่วงเวลาที่ยื่นรายงาน: 1 มีนาคม 2569 - 27 มีนาคม 2569


นำเสนอและลงนามในประชุมร่วมลูกค้าครั้งที่ 3/2026 (RBWF_MOM_EXT_20260327)

1. ความคืบหน้าของงานที่เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน

Task No	Task Description	Start Date	End Date	Progress	Duration (days)	Assigned To	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)	01-Jan-2026	31-Jan-2026	100%	31	นายวีระ เนียมโก๊ะ (AN, TL)	■■■■■		
2	พัฒนาระบบหลัก (Core System Development)	01-Feb-2026	15-Apr-2026	75%	74	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)		■■■■■	■■■■■
3	การทดสอบระบบ (System Testing)	16-Apr-2026	30-Apr-2026	0%	15	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)			
4	การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน (UAT)	01-May-2026	20-May-2026	0%	20	นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM)			
5	ส่งมอบระบบและประเมินผล (System Delivery)	21-May-2026	31-May-2026	0%	11	นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM)			

สรุป: งานพัฒนาหลักประมาณ 75% เอกสาร SDD ทวนสอบและ Validation วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลูกค้าลงนามรับมอบงานงวดที่ 2 ตาม SOW งานพัฒนาต่อเนื่องถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569 ตาม PMP คำขอ RBWF-CR-01 Profit Analysis อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดยไม่เพิ่มงบ

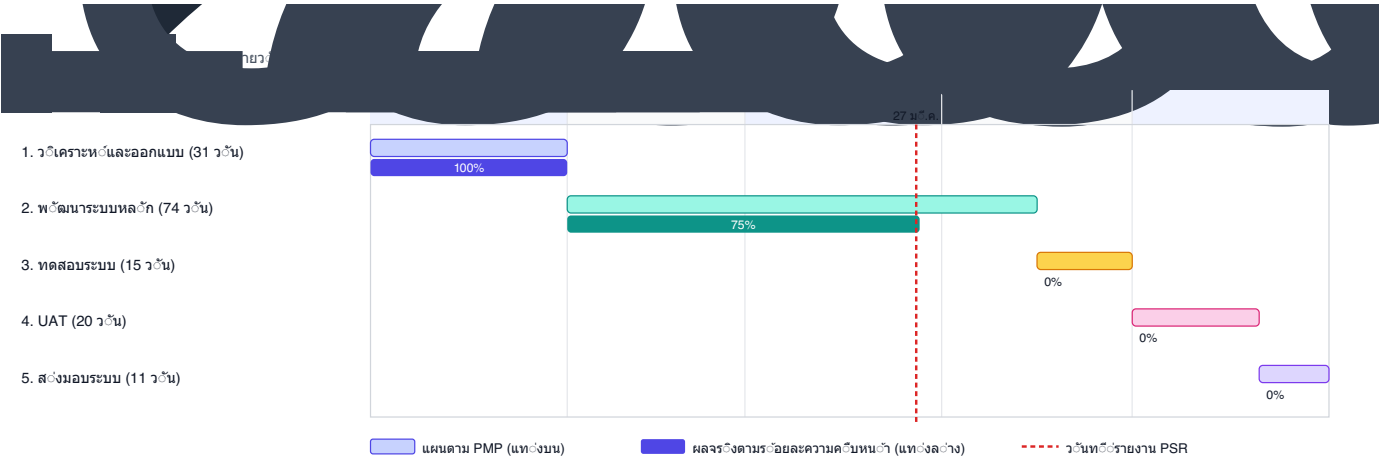

2. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอในระหว่างการดำเนินโครงการ

No	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
1	พิมพ์ใบเสนอราคา PDF สระไทยจม	อัปเดตไฟล์ Font และ Canvas Renderer (ISS-006)

3. เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม (บาท)	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด Task 1
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	111,000	ประมาณ 75% ของ Task 2 รวมงาน CR-01 โดยไม่เพิ่มงบ
บุคลากร (ทดสอบ / UAT / ส่งมอบ)	100,000	0	ยังไม่ถึงงวดงาน
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	15,000	สะสม 3 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	0	ยังไม่มีใช้
รวม	350,000	188,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และการแก้ไขหรือจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	CR-01 อนุมัติและบันทึกใน RBWF_CR	สูง	เฝ้าระวัง
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ใช้สแตกตาม IE ในงานประจำ	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	วางแผนภาระงานตาม PMP	ปานกลาง	เฝ้าระวัง
R-04 ความปลอดภัย API	เปิด HTTPS/TLS และ CORS บน Staging	สูง	กำลังลด
R-05 ความล่าช้าใกล้เกณฑ์ส่งซอฟต์แวร์หลักตาม SOW	ส่งงานงวดที่ 2 ตามเกณฑ์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569	สูง	เฝ้าระวัง
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
ความล่าช้าในการเตรียมข้อมูลทดสอบ	จัดทำ Mock Data Generator ก่อนเริ่มทดสอบวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569	ปานกลาง	เกิดขึ้นใหม่

5. ปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-006	24/03/2026	นายวีระ เนียมโกะ	การพิมพ์ใบเสนอราคา PDF สร้ไทยจ่ม	อัปเดตไฟล์ Font และ Canvas Renderer

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	เพิ่มระบบคำนวณกำไรขั้นต้น (Profit Analysis) ในใบเสนอราคา	อนุมัติแล้ว ไม่เพิ่มงบประมาณ

รายงานโดย: นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
วันที่: 27 มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ลงนามรับรองรายงานความก้าวหน้า

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อรไทรวรรณ (นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera N. (นายวีระ เนียมโกะ)	Pariyaa P. (นายปริญญ์ พงษ์ดนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)
