



บริษัท ลา-ออ จำกัด · โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)
เอกสารส่งตรวจ: RBWF_PSR_20260529



รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (Progress Status Report)

ประเภท: รายงานภายนอกสำหรับลูกค้า

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

วันที่รายงาน: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569


ช่วงเวลาที่ยืนยัน: 1 พฤษภาคม 2569 - 29 พฤษภาคม 2569

นำเสนอและลงนามในประชุมร่วมลูกค้าครั้งที่ 5/2026 (RBWF_MOM_EXT_20260529)

1. ความคืบหน้าของงานที่เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน

Task No	Task Description	Start Date	End Date	Progress	Duration (days)	Assigned To	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design)	01-Jan-2026	31-Jan-2026	100%	31	นายวีระ เนียมโก๊ะ (AN, TL)	■■■■■		
2	พัฒนาระบบหลัก (Core System Development)	01-Feb-2026	15-Apr-2026	100%	74	นายปริญญา พงษ์ดนตรี (DES, PR)		■■■■■	■■■■■
3	การทดสอบระบบ (System Testing)	16-Apr-2026	30-Apr-2026	100%	15	นายประกาศิต ทองนอก (TESTER)			
4	การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ (UAT)	01-May-2026	20-May-2026	100%	20	นางสาวปวีศา จันทรสภาพ (PM)			
5	ส่งมอบระบบและประเมินผล (System Delivery)	21-May-2026	31-May-2026	82%	11	นางสาวปวีศา จันทรสภาพ (PM)			

สรุป: UAT ปิดตามแผนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ลูกค้าลงนามรับมอบทั้งระบบและงวดที่ 3 ในวันเดียวกันวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 (RBWF_VLD_FINAL_20260529 และ RBWF_VLD_20260529) งานส่งมอบประมาณ 82% จะปิดคลังเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 คำขอเปลี่ยนแปลงทั้งสองรายการปิดตามทะเบียน RBWF_CR แล้ว ทดสอบ Restore ตาม ISS-010 ผ่านเกณฑ์กู้คืนภายใน 1 ชั่วโมง

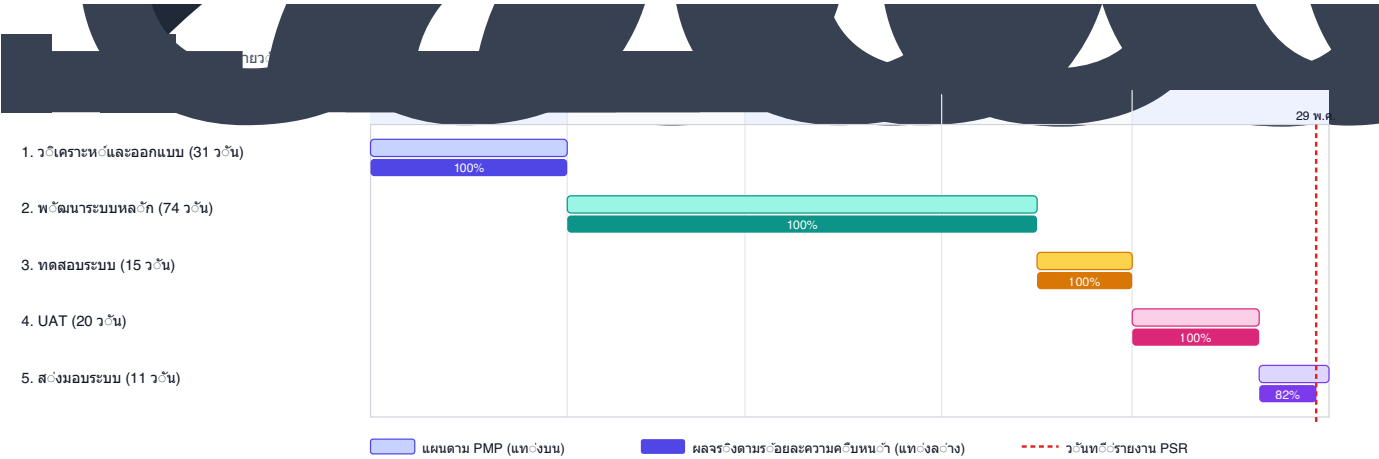

2. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอในระหว่างการดำเนินโครงการ

No	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
1	การเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานก่อนใช้งานจริง	ฝึกอบรมและส่งมอบคู่มือ SUD
2	การสำรองและกู้คืนข้อมูลก่อน Go-Live	ทดสอบ Restore สำเร็จตามเกณฑ์ 1 ชั่วโมง (ISS-010) จาก โฟลเดอร์ Google Drive

3. เปรียบเทียบตารางต้นทุนเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง

ประเภทต้นทุน	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	ต้นทุนที่ใช้จริงสะสม (บาท)	หมายเหตุ
บุคลากร (วิเคราะห์และออกแบบ)	62,000	62,000	ปิดงวด
บุคลากร (พัฒนาระบบหลัก)	148,000	148,000	ปิดงวด รวม CR โดยไม่เพิ่มงบ
บุคลากร (ทดสอบระบบ)	22,500	22,500	ปิดงวด
บุคลากร (UAT)	50,000	50,000	ปิดงวดวันที่ 20 พ.ค.
บุคลากร (ส่งมอบ)	27,500	22,500	ใกล้ปิด Task 5
เครื่องมือ เซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร	25,000	25,000	ครบ 5 เดือน
การทดสอบ QA และค่าเผื่อ	15,000	8,000	ค่าเผื่อ 7,000 ไม่ใช่ เพราะ CR ไม่เพิ่มงบ
รวม	350,000	338,000	ยังอยู่ในงบประมาณ

สรุป: ยังอยู่ในงบประมาณ

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และการแก้ไขหรือจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ

ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข	ระดับความเสี่ยง	โอกาสเกิด
R-01 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	ปิด CR ตามทะเบียน RBWF_CR ก่อนส่งมอบ	สูง	ลดแล้ว
R-02 ความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ	ปิดตามแผน IE	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-03 การขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะ	ภาระงานส่งมอบครบตามแผน	ปานกลาง	ลดแล้ว
R-04 ความปลอดภัย Production	คง JWT HTTPS RBAC หลังส่งมอบ	สูง	เฝ้าระวังต่อเนื่อง
R-05 ความล่าช้าพัฒนาหรือทดสอบ	UAT และส่งมอบตามแผน	สูง	ลดแล้ว
R-06 การเปลี่ยนแปลงไลบรารี	ล็อกเวอร์ชันในเอกสาร IE	ต่ำ	ลดแล้ว
R-07 การสื่อสารภายในทีม	มีรอบ MOM ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	ลดแล้ว
การโอนย้ายข้อมูลจริง	ทดสอบ Dry-Run Migration ก่อน Go-Live	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่
การบำรุงรักษาระยะรับประกัน	ช่องทาง Helpdesk และ SLA ในเอกสาร MA	ต่ำ	เกิดขึ้นใหม่

5. ปัญหาระหว่างดำเนินการ

เลขที่	วันที่รายงาน	ผู้พบรายงาน	ปัญหาที่พบ	แนวทางการดำเนินการ
ISS-009	15/05/2026	นายทีโนภาส อร์โทวรรณ	ปรับแต่งการตั้งชื่อหัวกระดาษในใบเสร็จ	อัปเดตไฟล์ Configuration
ISS-010	25/05/2026	นายประกาศิต ทองนอก	การสำรองข้อมูลอัตโนมัติและทดสอบ Restore	ทดสอบ Restore สำเร็จตามเกณฑ์ 1 ชั่วโมง

Change Request

CR ID	วันที่ยื่น	หัวข้อ	สถานะ
RBWF-CR-01	15 มีนาคม 2569	Profit Analysis ในใบเสนอราคา	ปิดงานแล้ว
RBWF-CR-02	20 เมษายน 2569	หน้าจอ Queue Display	ปิดงานแล้ว

รายงานโดย: นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (Project Manager)
วันที่: 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผู้ลงนามรับรองรายงานความก้าวหน้า

ผู้แทนลูกค้า	ผู้จัดการโครงการ (PM)	หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL)	นักออกแบบ/พัฒนา (DES/PR)	ผู้ทดสอบระบบ (TESTER)
ทีโนภาส อร์โทวรรณ (นายทีโนภาส อร์โทวรรณ)	Pawarisa J. (นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	Veera M. (นายวีระ เนียมโกะ)	Parinya P. (นายปริญญ์ พงษ์ดนตรี)	Prakasit T. (นายประกาศิต ทองนอก)
